

# Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	7 dia(s)	Saldo de prazo	173 dia(s)
Responsável técnico					
Data	06/10/2025	Dia da semana	segunda-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

Turno/Tempo	
<b>Manhã</b>	07:00 a 12:00
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00
<b>Noite</b>	

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	3,9000	m3	
INICIO DA CONSTRUÇÃO DO 'BARRACÃO'	1,0000	un	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5512	Insumo	PEDREIRO	Mão de obra direta	1
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
<b>Total:</b>				<b>14</b>

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLÇÃO 1º PAVIMENTO



CONSTRUÇÃO DO "BARRACÃO"

## Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	8 dia(s)	Saldo de prazo	172 dia(s)
Responsável técnico					
Data	07/10/2025	Dia da semana	terça-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

		Turno/Tempo
<b>Manhã</b>	07:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	1,0000	m3	
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO TERREO	4,3000	m3	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				<b>Total: 13</b>

Relatório fotográfico no Anexo I.





DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO PAVIMENTO TERREO

## Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	9 dia(s)	Saldo de prazo	171 dia(s)
Responsável técnico					
Data	08/10/2025	Dia da semana	quarta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

		Turno/Tempo
<b>Manhã</b>	07:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	3,0000	m3	
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO TERREO	4,5000	m3	
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO	1,0000	un	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				<b>Total: 13</b>

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO TERREO



DEMOLIÇÃO TERREO



CONSTRUÇÃO DE BARRCÃO



## Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	10 dia(s)	Saldo de prazo	170 dia(s)
Responsável técnico					
Data	09/10/2025	Dia da semana	quinta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação	FOI CONSTATADO O FURTO DE ALGUNS ITENS DA OBRA DEVIDO A ENTRADA DE UMA PESSOA PELO 1º PAVIMENTO A NOITE.				

Turno/Tempo		
<b>Manhã</b>	07:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		


Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	3,0000	m3	
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO TERREO	6,0000	m3	
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO	1,0000	un	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				<b>Total: 13</b>

Relatório fotográfico no Anexo I.



CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO

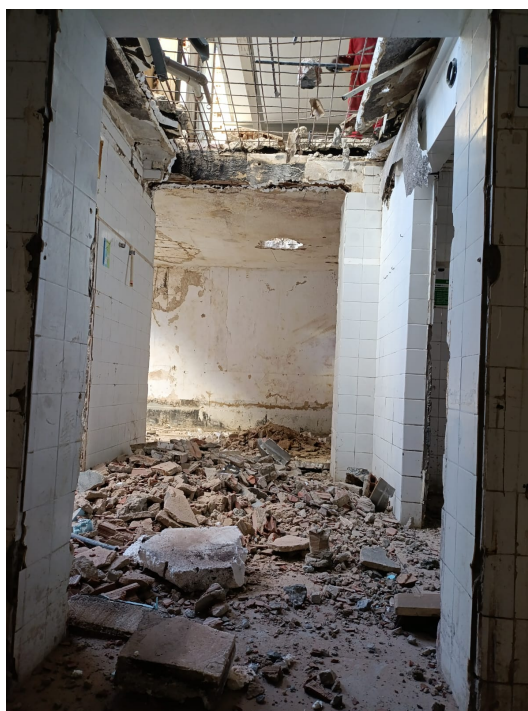

DEMOLIÇÃO PRIMEIRO PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO TERREO



MATERIAL DEMOLIDO



## Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	11 dia(s)	Saldo de prazo	169 dia(s)
Responsável técnico					
Data	10/10/2025	Dia da semana	sexta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

Turno/Tempo		
<b>Manhã</b>	07:00 a 12:00	Aberto
<b>Tarde</b>	13:00 a 17:00	Aberto
<b>Noite</b>		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	3,0000	m3	
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO TERREO	8,0000	m3	
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO	1,0000	un	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
<b>Total:</b>				<b>13</b>

Relatório fotográfico no Anexo I.



BARRACÃO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO TERREO



MATERIAL DEMOLIDO
