

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	0 dia(s)	Saldo de prazo	180 dia(s)
Responsável técnico					
Data	29/09/2025	Dia da semana	segunda-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

Turno/Tempo	
Manhã	07:00 a 12:00
Tarde	13:00 a 17:00
Noite	

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÕES DE ALVENARIA NO 1º PAVTO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA	20,0000	m3	

Ocorrências	
Descrição	Tipo de Ocorrência
OBRA CONTINUA SEM FORNECIMENTO D'ÁGUA . AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA MEDSENIOR PARA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA E CAMINHÃO PIPA	Ocorrência padrão

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5512	Insumo	PEDREIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO

Diário de Obra


Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	1 dia(s)	Saldo de prazo	179 dia(s)
Responsável técnico					
Data	30/09/2025	Dia da semana	terça-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação	OBS: HOUE LIBERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DA BOMBA DE RECALQUE COM PREVISÃO DE CHEGADA PARA 01/10/2025, DATA EM QUE SE INICIA O ABASTECIMENTO COM CARRO PIPA. FOI OBSERVADO NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA.				

Turno/Tempo		
Manhã	07:00 a 12:00	Chuva leve
Tarde	13:00 a 17:00	Chuva Forte
Noite		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO NO 1º PAVIMENTO, INICIO DAS INTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E RETIRADA DE INFRA ESTRUTURAS OBSOLETAS	10,0000	m3	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	10
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.

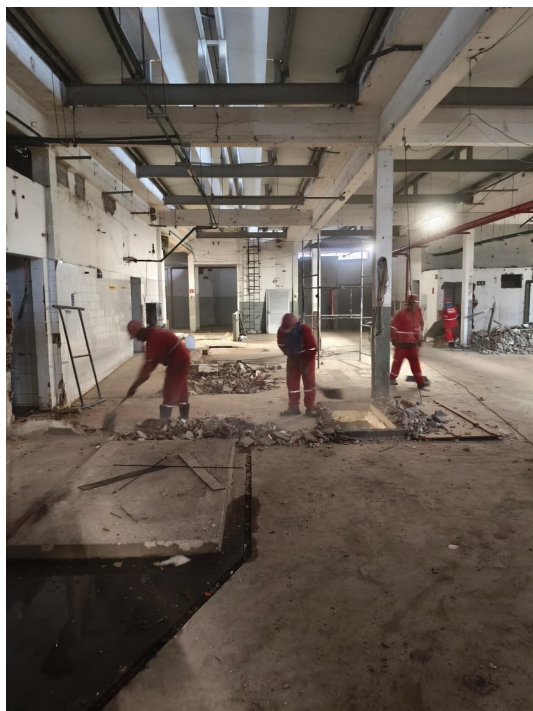

DEMOLIÇÕES 1º PAVIMENTO



PAREDES DOMOLIDAS 1º PAVIMENTO



MATERIAL DEMOLIDO



SUB ESTAÇÃO ABRIGADA

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	2 dia(s)	Saldo de prazo	178 dia(s)
Responsável técnico					
Data	01/10/2025	Dia da semana	quarta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação	BOMBA DE RECALQUE CHEGOU A OBRA BEM COMO O PRIMEIRO CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO.				

		Turno/Tempo
Manhã	07:00 a 12:00	Chuva leve
Tarde	13:00 a 17:00	Chuva leve
Noite		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO	8,3000	m3	MATERIAL DEMOLIDO SENDO DEPOSITADO NO TERREO

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5512	Insumo	PEDREIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



PÓS DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO DE ANTIGA CAMARA FRIA 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO DE ANTIGA CAMARA FRIA 1º PAVIMENTO



BOMBA DE RECALQUE INSTALADA

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	3 dia(s)	Saldo de prazo	177 dia(s)
Responsável técnico					
Data	02/10/2025	Dia da semana	quinta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

		Turno/Tempo
Manhã	07:00 a 12:00	Aberto
Tarde	13:00 a 17:00	Aberto
Noite		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO DE PAREDES E LAJES 1º PAVIMENTO	9,3700	m3	FOI INICIADA A DEMOLIÇÃO DAS PAREDES E LAJES DA ANTIGA CAMARA FRIA E ANTIGA SALA DE COFRES.

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	7
5512	Insumo	PEDREIRO	Mão de obra direta	1
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



INSPEÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO E PLUVIAL

Diário de Obra

Obra	3008 - REFORMA MEDSÊNIOR PS RECIFE PARQUE AMORIM - SAMEDIL (PR-467-08/25-R02)	Início da obra	29/09/2025	Término da obra	28/03/2026
Prazo da obra	180 dia(s)	Tempo decorrido	4 dia(s)	Saldo de prazo	176 dia(s)
Responsável técnico					
Data	03/10/2025	Dia da semana	sexta-feira		
Responsável	GABRIEL CABRAL DE SOUZA WANDERLEY				
Observação					

		Turno/Tempo
Manhã	07:00 a 12:00	Aberto
Tarde	13:00 a 17:00	Aberto
Noite		

Tarefas realizadas			
Tarefas avulsas			
Descrição	Qtde. Medida	Unidade	Observações
DEMOLIÇÃO DE PAREDES E LAJES 1º PAVIMENTO	3,3800	m3	

Equipe envolvida				
Código	Origem	Descrição	Atribuição	Qtde. utilizada
5511	Insumo	SERVENTE	Mão de obra direta	8
5520	Insumo	BETONEIRO	Mão de obra direta	1
5524	Insumo	ENGENHEIRO CIVIL (PJ)	Mão de obra direta	1
5525	Insumo	MESTRE DE OBRAS	Mão de obra direta	1
5526	Insumo	TÉCNICO DE SEGURANÇA	Mão de obra direta	1
5529	Insumo	AUXILIAR ALMOXARIFE	Mão de obra direta	1
				Total: 13

Relatório fotográfico no Anexo I.



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



DEMOLIÇÃO 1º PAVIMENTO



MATERIAL DEMOLIDO
